

Betriebsausschuss 04.03.2015


TOP 4

Sachstandsbericht

Aktuelle Investitionsvorhaben im Kanalnetzbereich 2015 ff

1. Zahlen und Fakten: Baumaßnahmen/Bausummen/Bauprogramme
2. Überblick Bauzeitenpläne
3. Überblick Lage der Einzelbaustellen
4. Einblicke in die Helmstedter Unterwelt / Arbeitsprozesse AEH
5. Planungsdetails ausgewählter Baumaßnahmen

Eine



-aufgabe

liegt vor uns!

**Schlusswort aus meiner Präsentation
des Eigenbetriebs AEH am
14.02.2012 an gleicher Stelle.**

Abwasserentsorgung Helmstedt
Investitionsprogramm aus HP 2015, 1. Nachtrag

Termine BTA 03. Mrz 15. Apr 17. Nov


| Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Finanzplan 2016 | Termine BTA | | | | Bauzeitenfenster (Baubeginn und Baufertigstellungstermin) | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------------|------------|----------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|-----|-----|---------|---------|-----|-----|-----|--|---------|--|
| | | | | LV Erstellung bis | Versand/ Veröffentlich. | Submission | Auftrags- vergabe | Mär | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | | | |
| Sammelposten 2013 Baumaßnahmen | | | | erl. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanalerneuerung Marienstraße | | 350.000,00 | | Planungsbeginn entsprechend Personalkapazität | | | | | | | | | | | | | | | | ? (170 m DN 900I, 3 Schächte) |
| Kanalerneuerung Tangermühlenweg | | 220.000,00 | | 09. Feb | 10. Feb | 24. Feb | 05. Mrz | 16. Mrz | (160 m, DN 400 PE-HD, 3 S) | | | | 05. Jun | | | | | | | |
| Kanalerneuerung Lindenplatz/Holzberg | | 60.000,00 | | 24. Feb | 24. Feb | 10. Mrz | 20. Mrz | | 07. Apr | (80 m DN 250 PE-HD, 4 Schächte) | | | | | | | | | 30. Aug | |
| Baugebiet Rottlande II 1. BA (2015 Planung) | | 70.000,00 | 380.000,00 | Planungsbeginn und Honorarvertrag 2. Jahreshälfte | | | | | | | | | | | | | | | | (340 m DN 200 PE-HD, 430 m Beton o.ä., 11 S) |
| Baugebiet Ziegelberg 2. BA (2014 Planung) | 60.000,00 | 330.000,00 | | 25. Feb | 06. Mrz | 19. Mrz | 01. Apr | | 08. Apr | (460 m PE-HD, 450 m Beton o.ä., 28 S) | | | | | | | | | 30. Aug | |
| Dorfbreite Kanalneubau | 80.000,00 | | | bedarfsorientiert nach Fortschreitung Grundstücksverkauf | | | | | | | | | | | | | | | | ? (370 m, DN 200 - 300) |
| BV Wiesenstraße | | 0,00 | | SW-Kanalverlegung durch Investor (Planung bis 10 KW noch nicht vorgelegt), Bauüberwachung durch AEH erforderlich | | | | | | | | | | | | | | | | (150 m DN 250, 3 Schächte) |
| Kanalerneuerung St. Barbara Weg | 100.000,00 | | | erl. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanalerneuerung Grubenweg | 70.000,00 | | | erl. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanalerneuerung Elzweg | 70.000,00 | | | 05. Jan | 05. Jan | 27. Jan | 05. Mrz | | | | | | 05. Mai | 30. Jun | | | | | | (70 m DN 250 PEHD, 1 Schacht) |
| Kanalsanierungen (wird für den Zeitraum 2016 ff. noch spezifiziert) | | | 600.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberflächenwasserableitu ng Sternberger Teich | 800.000,00 | 1.370.000,00 | 1.220.000,00 | 1. Ausschreibung 2. Jahreshälfte | | | | | | | | | | | | | | | | ? (1.500 m DN 800 - DN 1200) |
| Liner-Sanierungen | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 23. Jan | 26. Jan | 23. Feb | 13. Mrz | | | | | | | | | | | | | ? (750 m Liner DN 250 - DN 500) |
| | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | lfd. Maßnahmen nach Kundenbedarf | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PS Emmerstedt Hoch- wasserschutzmaßn. | 12.000,00 | | | erl. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDV-Software Ergänzung (ISYBAU aus TV) | 7.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werkzeuge und Geräte* | 8.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unvorhergesehenes als Ersatz | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionssummen inkl. Reste aus 2014 | 150.000,00 | 2.583.000,00 | 2.370.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bausumme Invest (inkl. Planung): ~2.750.000 €

Bausumme Reparatur (inkl. Rückst.): ~570.000 €

Baumassen: ~3,3 km Hauptkanäle; ~ 60 Schächte

Bausumme/Arbeitsstunde (2.000 h/a): ~1.660 €

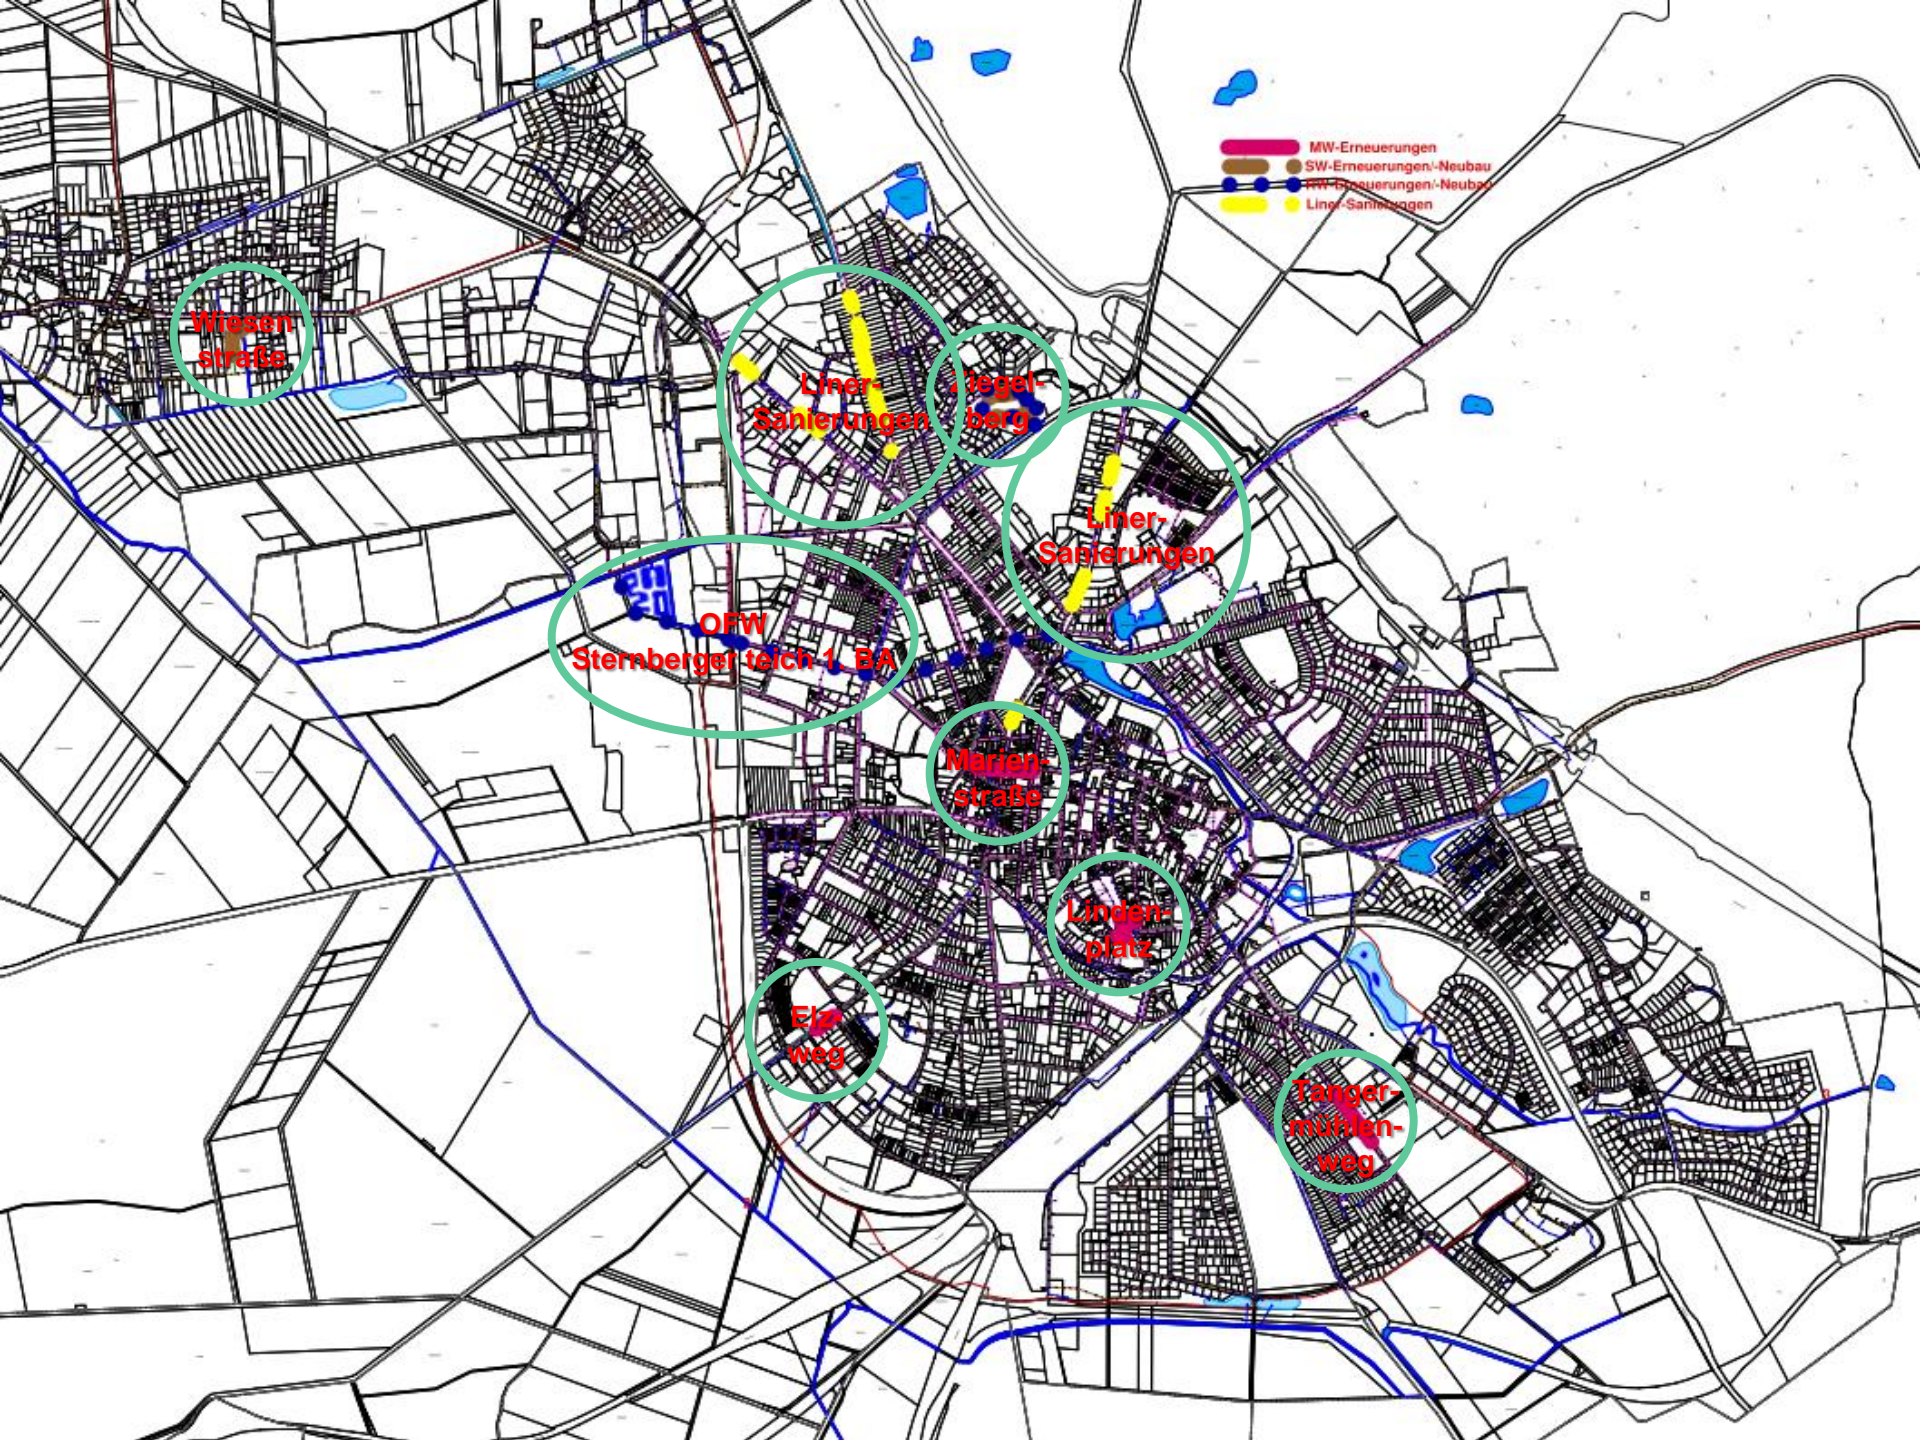

- MW-Erneuerungen
- SW-Erneuerungen/-Neubau
- FW-Erneuerungen/-Neubau
- Linien-Sanierungen

Wissenstraße

Linien-Sanierungen

Bebelberg

Linien-Sanierungen

OFW
Sternberger reich 1. BA

Marienstraße

Lindenplatz

Elmweg

Tangermühlweg
